

Полигон ТБО «Кулаковский»


Отчет о подготовке к рекультивации
29 сентября - 05 октября 2016 г.

Чеховский район Московской области

Отчет подготовлен силами ПАО «ПромЭкоТех» в соответствии с протоколом выездного совещания по итогам встречи с жителями д. Манушкино Чеховского муниципального района по Полигону ТБО «Кулаковский» 3 сентября 2016 г.

ОБЪЕМ ЗАВОЗИМЫХ ГРУНТОВ

Ежедневный объем завозимого грунта зависит от погодных условий

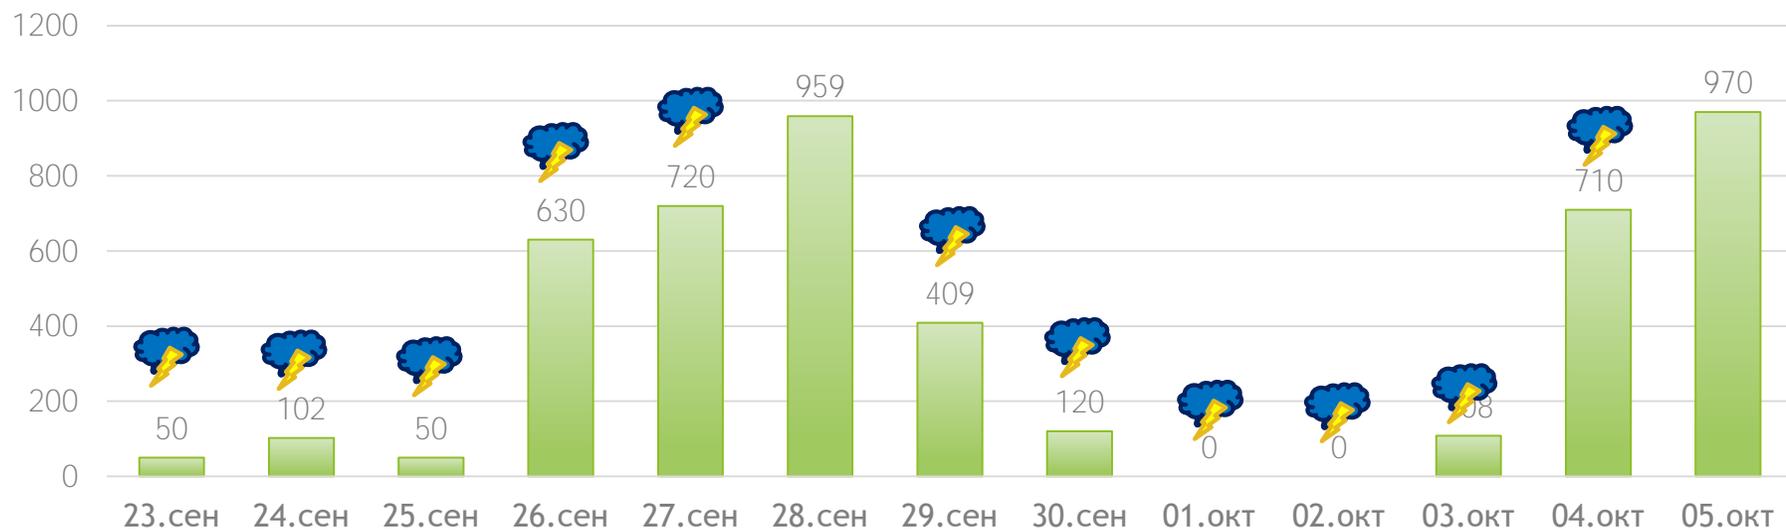


2 511 м³

2 317 м³

ОБЪЕМ ЗАВОЗИМОГО ТКО

Ежедневный объем завозимого ТКО не превышает 200 машин

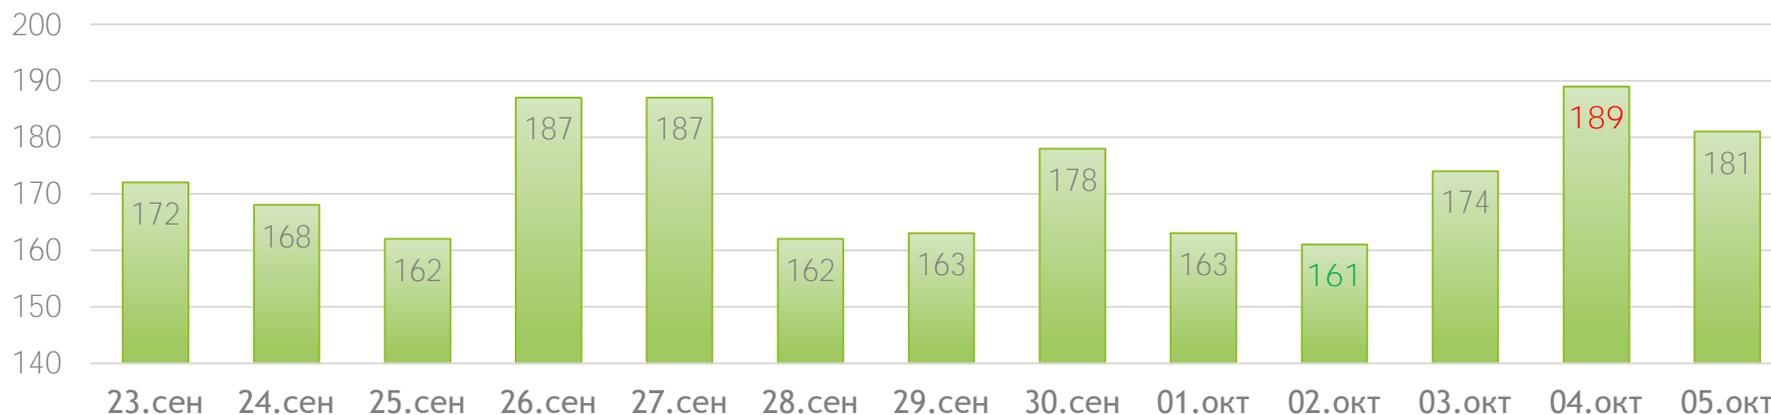

172,71 - среднесуточное количество машин

2 331,59 **м3** - среднесуточный объем ТКО

от 161 до 189 машин ввозили ТКО на Полигон

* 01-02 октября - выходные дни

ПОДГОТОВКА К РЕКУЛЬТИВАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

- ▶ 10 - 16 октября 2016 г. Планируется завершить строительство ограждения по периметру участка землеотвода (13,62 Га)

С северо-западной, северной и северо-восточной стороны уже смонтировано капитальное ограждение высотой 2 метра



1,5 км

- протяженность
ограждения, 2 метра
- высота



С юго-восточной, южной и юго-западной стороны завершаются работы по строительству каркаса

ПОДГОТОВКА К РЕКУЛЬТИВАЦИИ МОЙКА КОЛЕС НА ВЫЕЗДЕ

- ▶ 06 октября 2016 г. Планируется запустить мойку колес автомобилей на выезде из Полигона.



Монтаж эстакады для мойки колес.

В связи с увеличившимся завозом грунта техника, которая ранее чистила выезд на Старое Симферопольское шоссе не справляется.

Оператор принял решение установить станцию для мойки колес выезжающих автомобилей.

Мойка будет работать в ненастную погоду, когда грунт на теле Полигона становится рыхлым. В сухие дни достаточно дезинфекционной ванны на выезде.

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 05 октября 2016 г. Точка 1. Северная часть тела Полигона



29 сентября



05 октября

Площадка для сброса постепенно смещается на юг по часовой стрелке, неиспользуемые территории оперативно закрываются грунтом.



29 сентября



05 октября



29 сентября



05 октября



Точка 1

Видны новые поступления грунта, они будут использованы для отсыпки незакрытой части откоса ниже



29 сентября



05 октября

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 05 октября 2016 г. Точка 2. Южная часть тела Полигона



29 сентября



05 октября

Охрана постоянно проверяет Полигон на наличие посторонних лиц. Обходы совершаются и днем и ночью



29 сентября



05 октября



Точка 2



29 сентября



05 октября



29 сентября



05 октября

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 05 октября 2016 г. Точка 3. Западная часть Полигона



29 сентября



05 октября



29 сентября



05 октября

Дополнительно отсыпается
грунтом въезд на тело Полигона



29 сентября



05 октября



Точка 3



29 сентября



05 октября

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 05 октября 2016 г. Точка 4. Полигона с юга



29 сентября



05 октября



Точка 4



29 сентября



29 сентября



05 октября



05 октября

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 05 октября 2016 г. Точка 5. Полигон с востока. Земли Лесфонда

29 сентября




05 октября



ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 05 октября 2016 г. Юго-западная часть. Новая площадь накрытия грунтом



ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 05 октября 2016 г. Въезд на тело Полигона. Накрываются грунтом откосы

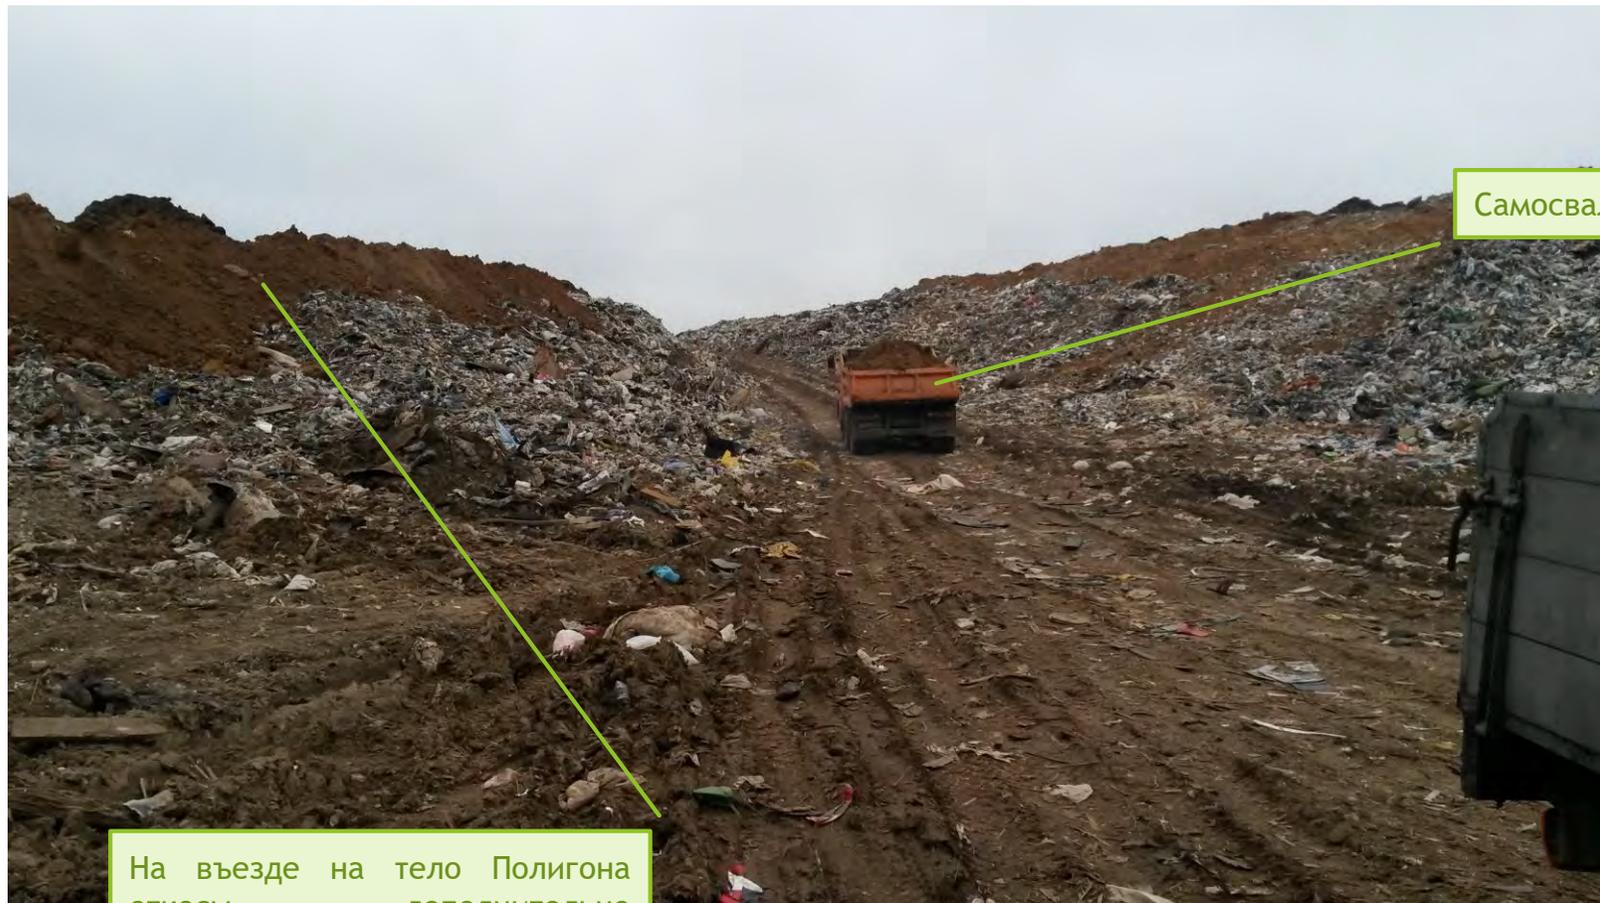

Самосвал с грунтом

На въезде на тело Полигона
откосы дополнительно
накрываются грунтом

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. Сентябрь 2016 г.



14 сентября



23 сентября

Более **15 000** м³ завезено на Полигон в сентябре 2016 г.



30 сентября



05 октября

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Рассылка информации представителям областных и муниципальных органов власти, общественным активистам и СМИ о деятельности оператора полигона за прошедшую неделю:

- ▶ 05-09 сентября 2016 г.
- ▶ 12-16 сентября 2016 г.
- ▶ 19-23 сентября 2016 г.
- ▶ 23-28 сентября 2016 г.
- ▶ 28 сентября - 05 октября 2016 г.

05.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

На Полигоне "Кулаковский" появится собственная мойка

ПАО «ПромЭкоТех» продолжает подготовку к рекультивации Полигона ТБО Кулаковскиф. Так, по периметру отведенного участка в 13,62 Га во всю идут монтажные работы. Здесь строители возводят забор, который станет существенной преградой для посторонних лиц.

Также выезд из полигона в скором времени будет оборудован специальным моечным комплексом. Это мобильный пункт, который предназначен для очистки колес самосвалов после разгрузки грунта в непогоду. Строительство мини-мойки особенно актуально в осенне-весенний период, когда на полигоне рыхлая почва. Необходимость строительства мойки возникла в связи с увеличением завоза грунта на Полигон: трактор который раньше смывал грязь от машин с Симферопольского шоссе уже не справляется со своей задачей.

А пока непогода, железному «уборщику» приходится трудиться. В период с 29 сентября по 5 октября на полигон ТБО «Кулаковский» с карьера было завезено порядка 2317 м³ грунта. Снова в работу вмешался дождь. В ночь с 1 на 2 октября был особенно сильный ливень и за два дня удалось завести лишь 58 м³ и 92 м³ соответственно. Зато уже 5 октября было ввезено 970 м³.

В настоящее время практически вся площадь полигона ТБО «Кулаковский», закрыта грунтом. Исключение составляет участок рабочей карты, где осуществляется размещение отходов. Весь мусор поступает исключительно с территории Чеховского района.

Среднесуточное количество рейсов с ТБО составляет 172,71 единицы. Больше всего машин заезжало 4 октября - 189 единиц, минимум зарегистрирован в выходной 2 октября - 161 машина.

Спасибо за внимание!

Презентация подготовлена: ПАО «ПромЭкоТех»

42300, Московская область, г. Чехов,
ул. Солнышевская, д. 3а, пом. IV и VI

Телефон организации: (496) 726-83-65

E-mail организации: promecotex@rambler.ru
